



CLUB TERRAZAS

OBRA: PANTALLA GIGANTE EN CANCHA N°3

SEDE: PRINCIPAL



CLUB TERRAZAS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA



CLUB TERRAZAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Oficina de Infraestructura y Obras 1

PROYECTO : PANTALLA CANCHA N°3 DE FUTBOL
SEDE : PRINCIPAL
UBICACIÓN : MALECON 28 DE JULIO N°390 - MIRAFLORES

A. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO.

El motivo de la cual se realizo la pantalla en la Cancha N°3 fue por entretenimiento para el público.

B. CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO.

Se realizo el levantamiento en 3D.

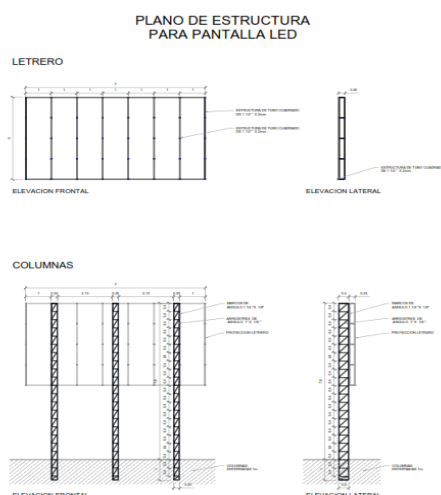


Foto N°1: Estructura metalica

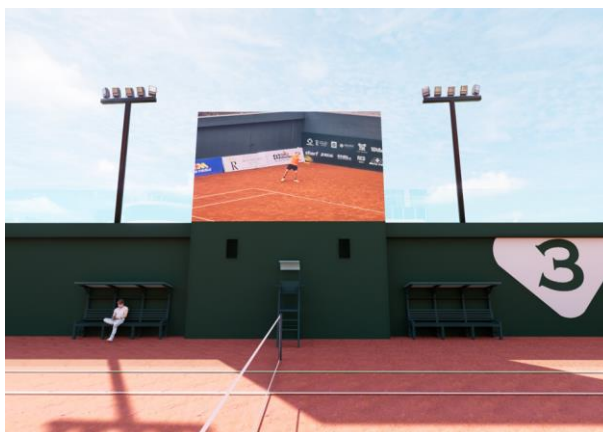


Foto N°2: Elevacion en 3D

C. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

Se realizaron tres excavaciones de 1.20 metros de profundidad con el objetivo de garantizar la estabilidad de la estructura metálica que se iba a instalar. Posteriormente, se llevó a cabo el solado para proporcionar un soporte adecuado, creando una base firme. El área excavada fue rellenada con concreto armado, asegurando la resistencia necesaria para la fijación y colocación de las columnas metálicas. Una vez aseguradas las columnas, se construyó una viga metálica tipo pórtico, que soporta la estructura.



CLUB TERRAZAS

Finalmente, sobre esta viga, se colocó una pantalla LED de 7x4 metros, asegurando su correcta fijación y funcionamiento, en la cual se perforo y se anclo a la viga existente.



D. EMPRESA EJECUTORA.

Razón social: EMD ASOCIADOS S.A.C

RUC : 20523214846

E. CUADRO DEL PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO INICIAL

Lima, 08 de Mayo del 2024.

Señores:

Club Tennis Las Terrazas Miraflores

Presente.-

At.- Sr. Cesar Gutierrez Hillasaca
Gerente General

Ref.- Venta de Estructura de fierro para Pantalla LED video
Sede .- Club Terrazas Miraflores, campo principal de Tenis.

Estimados señores:

Es grato saludarlos y a la vez presentarles la siguiente propuesta:

Características:

Estructura de fierro para pantalla LED de 7 x 4 m. .-

Elaborado con 03 vigas tijerales parantes a 1.00 m. bajo tierra, asegurado con concreto. Base anticorrosiva y pintura esmalte sintético sobre esa base. Incluye instalación de la estructura y de la pantalla LED.

Vigas de 40 x 25 cm. Tejido con ángulos de 1 ½ x 1/8, Marco de tubos cuadrados de 1 ½ x 2mm.

Estructura de fierro con las vigas forradas con lata S/27,400.00+IGV.

Total.....S/32,332.00 Inc. IGV

Punto de luz y llave.- Proporcionado por el cliente.

Asesoría.- Gratuita.

EPPS.- Obligatorio.

SCTR .- Vigente

Horario.- de 8.00 a 5.00 PM.

Entrada por el lado de bajada Balta, no hay acceso a telescópica.

Forma de pago.- Adelanto 60 %...S/19,399.20

Saldo , Al contado Instalado y probado....S/12,932.80

Plazo de entrega.-La estructura 11 días útiles de elaboración.03 Día aprox.

De instalación.

Garantía.-01 Año.

Sin otro particular y en espera de sus gratas órdenes y para darle validez de contrato firman a continuación ambas partes.

DIRECCION: Av. Argentina 740 Of 1018 Edificio-Galería "El Reloj" Lima.
TELEFONOS: 944570337-990594725-916168146



CLUB TERRAZAS

F. TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Inicio : 30/07/2024

Fin : 13/08/2024

G. FOTOS DEL PROYECTO.





CLUB TERRAZAS





CLUB TERRAZAS

2. INFORME DEL PROYECTO



CLUB TERRAZAS

INFORME DEL PROYECTO

PROYECTO: Pantalla Gigante en cancha N°3

FECHA: 13/08/2025

Oficina de Infraestructura y Obras – OIO

1. ANTECEDENTES

El presente informe tiene como finalidad detallar el resultado del proceso de selección y la propuesta económica del proyecto “Pantalla Gigante en cancha N.º 3”, incluyendo el precio base y los antecedentes de la convocatoria, cuya propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo el 17-05-2024.

2. PROPUESTA ECONOMICA

· Los montos incluyen IGV

Concepto	Monto (S/.)
Precio Base	32 332.00
Total	32 332.00

Notas:

- El precio base corresponde al alcance inicial del proyecto según las especificaciones técnicas aprobadas.

A continuación, se presentan el cuadro de pago ejecutado:

Nº Doc. Factura	Pago	Fecha programada	%	Importe S/.
E001- 482	01		60%	19.399,20
E001-521	02	23-ago	40%	12.932,80
TOTAL S/. :				32.332,00

3. CONCLUSIONES

- La adjudicación fue otorgada a EMD ASOCIADOS S.A.C., en concordancia del Consejo Directivo, por cumplir con los requisitos técnicos y presentar la propuesta considerada más conveniente. El monto total asciende a S/ 32 332.00

4. ANEXOS
